ETH ARGE HPQ

4- Wochenprogramm Tiefbau / Hochbau

16.05.2024 Pfings

Schlechtwettertage sind nicht enthalten und verlängern entsprechend die Bauzeit.

Monat	Mai							Mai / Juni							Juni							Juni						
KW	21							22							23							24						
Tag	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
Datum	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

Arbeiten	Dauer	Bemerkungen
Baustelleneinrichtung		
Anlieferung Ost: New Jersey Element versetzen und Fundation ergänzen		
Anlieferung Ost: Walzbeton einbringen		
Aushub und Kanalisation Anlieferung und Strasseneinschnitt		
Diverse Tiefbau-Kleinarbeiten bei Anlieferung		
Installationskanal Anlieferung		
Containerabladeplatz Brüstungen		
Wände Rampe Et.6.1 zu Et.6.2		
Bodenplatte Et. 6.2		UA Einl OA
Wände Et. 5B		
Wände Et. 5C		
Wände Et. 6		
Aussteifung Baugrube		
Montage mit Aussteifung 3. Lage		3.Lage
Aushub 3. Lage		
Aushubarbeiten		
Betonlongarine 3. Lage		
Schlitzwandfläche bearbeiten, Holzeinlagen entfernen Betonlongarine schalen, bewehren und betonieren		
Baustellenabwasserbehandlung		
Betrieb Anlage ETH und Wolfgang-Pauli Strasse		

Inventar
Marti TB: RpBg 22to
Marti TB: RpBg 9to
EBAG Bagger, rp -30 to
EBAG Bagger, pb -18 to
EBAG Bagger, rp -5 to
EBAG Kompaktlader
EBAG Bulldozer
EBAG Radlader mit Strassenreinigungsbürste
EBAG Sennenbogen
Barmettler EWS-Bohrinstallation

Lärm		
Stufe 1 = Normal		
Stufe 2 = Erhöht		Stundenweise Fräs- und Spitzarbeiten SW
Stufe 3 = Hoch		Jetting Schlitzwand

Anlieferung: Etappierung Bodenplatte/Wände

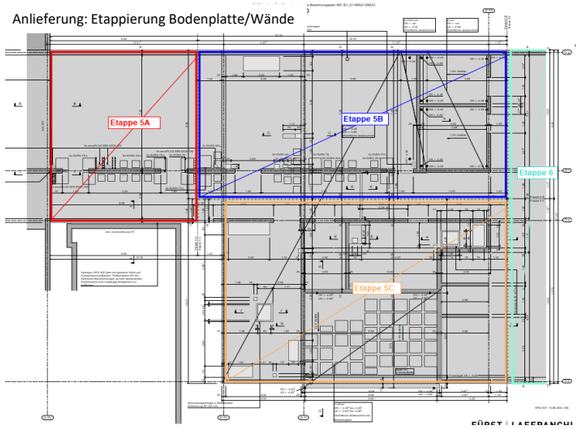
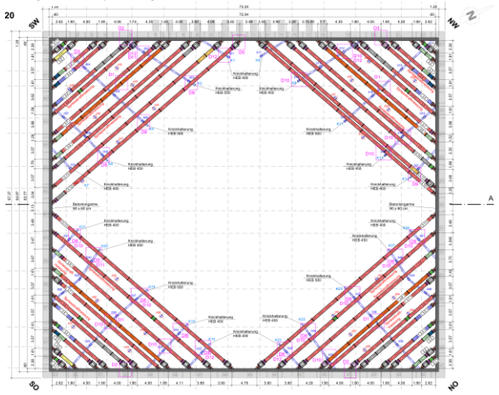
Baugrube: 3. Spriesslage
